



### (1) Bordillo

**Creado el:** Sat, 11/23/2024

Trasiego de bordillo al acceso del conjunto



### (2) Adoquin

**Creado el:** Sat, 11/23/2024

Se finaliza adoquín de los paños que se levantaron y reinstalaron se evidencia la pendiente y que no presenta aposamientos



### (3) Corte Adoquín

**Creado el:** Sat, 11/23/2024

Se realiza corte de adoquín nuevo



### (4) Adoquín

**Creado el:** Sat, 11/23/2024

Se realiza levantamiento nueva compactación y acomodación de adoquín nuevo, donde se evidenció la ir debido a la fuertes lluvias se aposaba agua



### (5) Aseo

**Creado el:** Sat, 11/23/2024


Se limpia la zona 1 de todo material sobrante



### (6) Escombros

**Creado el:** Sat, 11/23/2024

El contratista solicita un día para acopio de escombros en el Paqueadero para poder sacar el viaje acumulado

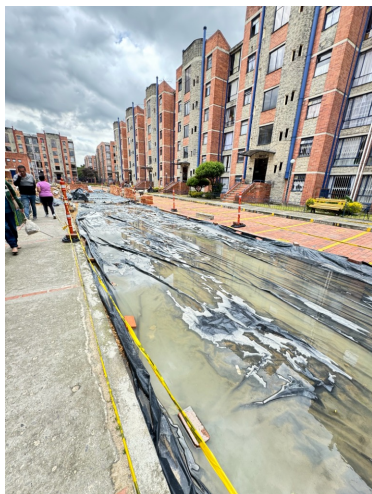

### (7) Zona 3

**Creado el:** Sat, 11/23/2024

Se evidencia que hay mucha agua apodada en la zona 3 debido a las fuertes lluvias a pesar que el contratista trata de evacuarla



### (8) Lluvias

**Creado el:** Sat, 11/23/2024

El día de hoy se laboró normalmente aunque se han presentado fuertes lluvias en la noche



### (9) Aseo

**Creado el:** Sat, 11/23/2024

Se realiza aseo de baños y zonas de uso de la obra

Visita 14 de Noviembre 2024
